

ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

Սույն վերլուծական տեղեկանքը կազմվել է հաշվի առնելով ՆՏ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2006 թվականի նոյեմբերի 30-ի № 303Ա որոշմամբ համաձայնեցված «Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի 2006-2009 թվականների ներդրումային ծրագրի շրջանակներում 2007 թվականին իրականացված փաստացի ներդրումների վերաբերյալ ընկերության 2008 թվականի ապրիլի 3-ի № 2/9-012 գրությամբ ներկայացված հաշվետվությունը:

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի 2007 թվականի ներդրումային ծրագիրը

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի 2007 թվականի տարեկան ներդրումային ծրագիրը հանդիսանում է ընկերության 2006-2009 թվականների քառամյա ներդրումային ծրագրի բաղկացուցիչ մասը: Ներդրումային ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է փարբեր միջոցառումներ իրականացնել ընկերությանը պատկանող ՆԷԿ-երի վերականգնման և վերազինման, անվտանգության բարձրացման և էլեկտրակայանքների փոխարինման նպատակով: Ներդրումներ է նախատեսվում իրականացնել նաև ընկերության բնականոն գործունեության ապահովման նպատակով՝ մեքենաների և մեխանիզմների, համակարգչային տեխնիկայի և տնտեսական գույքի ձեռքբերման ուղղությամբ:

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի 2006-2009 թվականների ներդրումային ծրագրով նախատեսված է իրականացնել 9 954,2¹ մլն դրամի ներդրումներ, որից 3 012,0 մլն դրամը 2007 թվականին: 2007 թվականի ներդրումային ծրագրի հիմնական ուղղությունները հետևյալն են.


- ա) «Երևան» ՆԷԿ-ի վերականգնման ուղղությամբ ներդրումներ՝ 2 781,0 մլն դրամ,
- բ) «Սևան» ՆԷԿ-ում էլեկտրակայանքների փոխարինում՝ 100,0 մլն դրամ,
- գ) ընկերության բնականոն գործունեության ապահովման նպատակով այլ ներդրումներ, այդ թվում՝
 - մեքենաների և մեխանիզմների ձեռքբերում՝ 124,0 մլն դրամ,
 - հաշվապահական հաշվառման նոր ծրագրային փաթեթի ձեռքբերում՝ 5,0 մլն դրամ,

¹ Սույն վերլուծական տեղեկանքում ներկայացված բոլոր գումարները չեն ներառում ավելացված արժեքի հարկը:

- համակարգչային տեխնիկայի և արքեսուարների ձեռքբերում՝ 2,0 մլն դրամ:

Ստորև՝ գրաֆիկ 1-ում, ներկայացված է ընկերության 2007 թվականի ներդրումային ծրագրի ծավալների բաշխումը հիմնական ուղղությունների միջև:

Պ ծ Ը ԱՔ 1

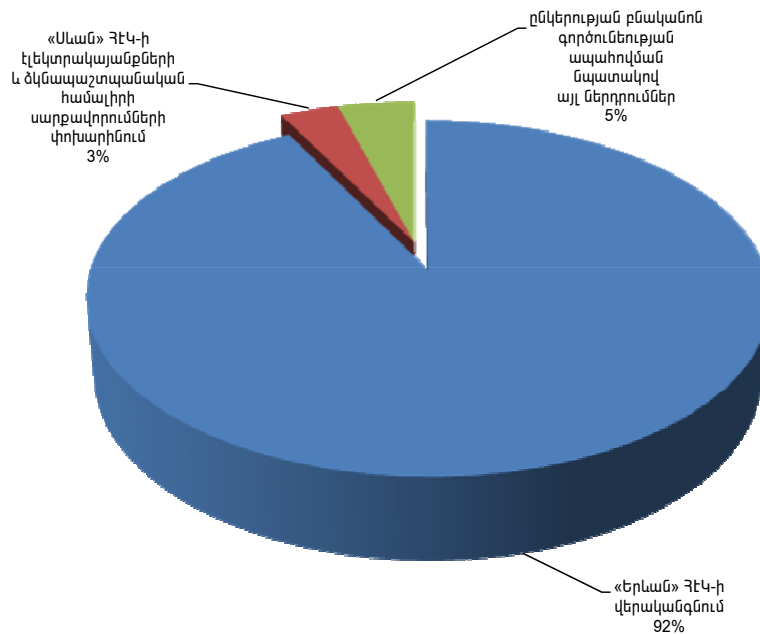

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի կողմից 2007 թվականին իրականացված ներդրումները

Նամաձայն փաստացի կատարված ներդրումների մասին հանձնաժողով ներկայացված հաշվետվության, 2007 թվականի ընթացքում ընկերությունը ներդրել է 321,95 մլն դրամի գումար, որը կազմում է հանձնաժողովի հետ համաձայնեցված ներդրումների ծավալի 10,7%-ը, մասնավորապես.

ա) Երևան ՆԷԿ-ի վերականգնման քառամյա՝ 8107,0 մլն դրամ ընդհանուր արժեքով ներդրումային ծրագրից 2007 թվականին նախատեսվում էր իրականացնել 2 781,0 մլն դրամի աշխատանքներ: Երևան ՆԷԿ-ի վերականգնման շրջանակներում իրականացվել են ներդրումներ հետևյալ ուղղություններով.

- Նիդրոպուրբինի և հիդրոգեներապորի վերականգնում՝ 0.31 մլն դրամ: Այս ուղղությամբ ներդրումային ծրագրով 2007 թվականին նախատեսվում էր իրականացնել 200.0 մլն դրամի ներդրումներ և աշխատանքներն ավարտել 2008 թվականին՝ կատարելով ևս 394.0 մլն դրամի ներդրումներ: Նշված

ներդրումները կապարվել են հիդրոգեներապորի փայտյթների ապամոնոֆաժման աշխատանքների ուղղությամբ:

- Գլխամասային կառույցների վերականգնում՝ ներառյալ ջրավազանի մաքրում՝ 0.78 մլն դրամ: Նշենք, որ այս ուղղությամբ 2007 թվականին նախատեսվում էր իրականացնել 128.0 մլն դրամի ներդրումներ: Գլխամասային կառույցների վերականգնման աշխատանքները նախատեսվում էր ավարտել 2009 թվականին՝ 2008 և 2009 թվականներին համապատասխանաբար ներդնելով ևս 280.0 և 108.0 մլն դրամ: Նշված ներդրումները կապարվել են գլխամասային կառույցների վերականգնման նախագծային և փորձաքննական աշխատանքների ուղղությամբ: Կապարված ներդրումների մի մասը՝ 0,33 մլն դրամը, ձևակերպվել է ընթացիկ ծախսերով, իսկ մնացածը՝ 0,45 մլն դրամը՝ մնացել է անավարտ:

- Դերիվացիայի վերականգնում՝ 173,04 մլն դրամ: Դերիվացիայի վերականգնման ուղղությամբ 2006-2009 թվականների համար նախատեսված էր իրականացնել 560,0 մլն դրամի ներդրումներ: 2006 թվականին այս ուղղությամբ ընկերությունն իրականացրել էր 387,35 մլն դրամի ներդրումներ նախատեսված 350,0 մլն դրամի փոխարեն: Գերազանցող ներդրումների 37,35 մլն դրամ ծավալը իրականացվել էր ի հաշիվ ներդրումային ծրագրի 2007 թվականի ներդրումների ծավալի: Փաստորեն, 2006-2007 թվականների ընթացքում դերիվացիայի վերականգնման ուղղությամբ ընկերությունը փաստացիորեն իրականացրել է 560,39 մլն դրամի ներդրումներ՝ նախատեսված 560,0 մլն դրամի փոխարեն:

Երևան ՆԷԿ-ի վերականգնման ուղղությամբ 2007 թվականին ընկերությունը նաև իրականացրել է խորհրդարկական ծառայությունների ձեռքբերմանն ուղղված 122,85 մլն դրամի ներդրումներ, որոնք մնացել են անավարտ:

- Շենքերի ու շինությունների վերականգնում՝ 6,19 մլն դրամ: Այս ուղղությամբ 2007 թվականին նախատեսվում էր իրականացնել 130.0 մլն դրամի ներդրումներ: Շենքերի ու շինությունների վերականգնման աշխատանքները նախատեսվում էր ավարտել 2008 թվականին՝ ներդնելով ևս 138.0 մլն դրամ: 2007 թվականին այս ուղղությամբ իրականացված բոլոր աշխատանքները մնացել են անավարտ:

- Երևան ՆԷԿ-ի վերականգնման նպատակով ընկերության 2007 թվականի ներդրումային ծրագրի մնացած ուղղություններով ներդրումներ չեն իրականացվել:

բ) Սևան ՆԷԿ-ում 2007 թվականի ընթացքում նախատեսվում էր իրականացնել 100,0 մլն դրամի ներդրումներ՝ էլեկտրակայանների փոխարինման նպատակով: Այս ուղղությամբ 2007 թվականին ներդրումներ չեն իրականացվել:

գ) Նամակարգչային տեխնիկայի և աքսեսուարների ձեռքբերման ուղղությամբ 2007 թվականին նախատեսվում էր իրականացնել 2.0 մլն դրամի ներդրումներ: Այս ուղղությամբ 2007 թվականին իրականացված ներդրումների ծավալը կազմել է 2,24 մլն դրամ:

Բացի վերը նշվածը, 2007 թվականին ներդրումներ են իրականացվել նաև անհետաձգելի աշխարանքների իրականացման նպատակով՝ Նրազդան ՆԷԿ-ի N3 դերիվացիոն ջրանցքի վթարային վերականգնում՝ 9,70 մլն դրամ ծավալով և Քանաքեռ ՆԷԿ-ի N1 խողովակագծի վթարային վերականգնում N2 խարսխահենարանի շրջանում՝ 6,85 մլն դրամ ծավալով, որոնց անհետաձգելիության հիմնավորումը ներկայացվել է հանձնաժողով:

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է հանձնաժողովի հետ համաձայնեցված և փաստացի կատարված ներդրումների համեմատական գնահատականը:

ԱՂՅՈՒՄԱԿ 1

N	Ներդրումային ծրագրի ուղղության, ենթաուղղության անվանումը	Հանձնաժողովի հետ 2007 թվականի համար համաձայնեցված ներդրումների կանխատեսվող ծավալը		2007 թվականի ընթացքում փաստացի կատարված ներդրումների ծավալը		2007 թվականի ընթացքում ավարտված ներդրումների ծավալը**		Ներդրումային ծրագրի կատարման ցուցանիշը
		3	4	5	6	7	8	
1	2	մլն դրամ	%*	մլն դրամ	%*	մլն դրամ	%*	9
1	Երևան ՆԷԿ-ի վերականգնում, այդ թվում	2781,0	92,3	303,17	94,2	561,03	96,8	10,9
1.1	Նիդրոտուրբինի և հիդրոգեներատորի վերականգնում	200,0	6,6	0,31	0,1	0,31	0,1	0,2
1.2	Գլխամասային կառույցների վերականգնում, ներստյալ ջրավազանի մաքրում	128,0	4,3	0,78	0,2	0,33	0,1	0,6
1.3	Դերիվացիայի վերականգնում	210,0	6,9	173,04	53,8	560,39	96,6	82,4
1.4	Շենքերի և շինությունների վերականգնում	130,0	4,3	6,19	1,9	0,0	0,0	4,8

1.5	Խորհրդարարական ծառայություններ	-	-	122,85	38,2	0,0	0,0	0,0
1.6	Երևան ՎԷԿ-ի վերականգնման ուղղությամբ այլ ներդրումներ	2113,0	70,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Սևան ՎԷԿ-ի էլեկտրակայանքների և ձկնապաշտպանական համալիրի սարքավորումների փոխարինում	100,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Այլ ուղղություններով իրականացվելիք ներդրումներ	131,0	4,4	2,24	0,7	2,24	0,4	1,7
4	ԸՆԴԱՄԵՆԸ (ներդրումային ծրագրի շրջանակներում)	3012,0	100,0	305,40	94,9	563,26	97,2	10,1
5	Անհերաձգելի աշխատանքների իրականացման նպատակով կատարված ներդրումներ			16,55	5,1	16,55	2,8	
6	ԸՆԴԱՄԵՆԸ (իրականացված ներդրումներ)			321,95	100,0	579,81	100,0	

- * Տոկոսային հարաբերությունները ներկայացնում են փվյալ ուղղության ներդրումների ծավալի տեսակարար կշիռը ներդրումային ծրագրի կամ փաստացի իրականացված ներդրումների ընդհանուր ծավալի նկատմամբ:
- ** Այս սյունակում ներկայացվում է նախորդ ժամանակաշրջանում անավարտ թողնված՝ 2007 թվականին ավարտված և 2007 թվականի կատարված և ավարտված ներդրումների հանրագումարը:

Նանրագումարի բերելով վերը նշվածը պետք է փաստենք, որ.

- իրականացված ներդրումների արդյունքում շահագործման են հանձնվել 579,81 մլն դրամի հիմնական միջոցներ, որոնց արժեքը ձևավորվել է 2006 թվականին անավարտ մնացած 387.35 մլն դրամի և 2007 թվականին իրականացված 192,46 մլն դրամի ներդրումների ծավալի գումարից, որից 7.48 մլն դրամը կատարված ընթացիկ ծախսերով ձևակերպված ներդրումներով:
- 2007 թվականին իրականացված ներդրումների ծավալից Երևան ՎԷԿ-ում իրականացված 129,49 մլն դրամի աշխատանքներ մնացել են անավարտ:

Ստորև՝ աղյուսակ 2-ում, ներկայացված են իրականացված ներդրումների ձևավորման աղբյուրները:

ԱՂՅՈՒՄԱԿ 2

N	Ներդրումների ձևավորման աղբյուրները	Կապիտալացված և հեռագա կապիտալացման ենթակա ծախսեր (մլն դրամ)	Ընթացիկ ծախսեր (մլն դրամ)	Ընդամենը (մլն դրամ)
1	2	3	4	5
1	Նախորդ ժամանակահատվածում իրականացված ներդրումներից	387,35	-	387,35

2	Կողմնակի կազմակերպությունների միջոցով կարարված աշխատանքներից	312,23	7,17	319,40
3	Տեղակայում չպահանջող հիմնական միջոցներից	2,24	-	2,24
4	Սեփական ուժերով կարարված աշխատանքներից	0,0	0,31	0,31
4.1	աշխատավարձ և սոցիալական ապահովության ծախսեր	0,0	0,31	0,31
4.2	հումք և նյութեր	0,0	0,0	0,0
4.3	տեղակայման ենթակա սարքավորումներ	0,0	0,0	0,0
4.4	այլ	0,0	0,0	0,0
5	Ընդամենը	701,82	7,48	709,30

Ինչպես փեսնում ենք աղյուսակ 2-ից, 2007 թվականին իրականացված ներդրումների ծավալի մոտ 98,9%-ը հանդիսանում է կապիտալացված և հեփազայում կապիտալացման ենթակա աշխատանքների արժեքը, որի մոտ 44,5%-ը իրականացվել է այլ կազմակերպությունների միջոցով: Ներդրումների ընդհանուր ծավալի 1,1%-ը հանդիսանում է ընթացիկ ծախսերով ձևակերպված աշխատանքների արժեքը, որի մոտ 96,0%-ը կողմնակի կազմակերպությունների կողմից իրականացված աշխատանքներն են, իսկ մնացած 4,0%-ը՝ սեփական ուժերով կարարված աշխատանքները: 2007 թվականին իրականացված ներդրումների ծավալի մոտ 0,3%-ը հանդիսանում են ընկերության բնականոն գործունեության ապահովման նպատակով համակարգչային փեխնիկայի և արքեսուարների ձեռքբերմանն ուղղված ներդրումները:

«Միջազգային էներգետիկ կորպորացիա» ՓԲԸ-ի սակագնով փոխհատուցման ենթակա ներդրումների ծավալը

2007 թվականներին փաստացի իրականացրած ներդրումների ծավալից սակագնի վերանայման ժամանակ փոխհատուցման ենթակա ներդրումների ծավալը կորոշվի հետևյալ կերպ՝

$$ՄՓՆ = ԻՆ(2007) - ԱԱ(2007) + ԱԱՇ(2006) - ՕՕՉՆ(2007)$$

որտեղ՝

ՄՓՆ սակագնի վերանայման ժամանակ փոխհատուցման ենթակա ներդրումների ծավալն է,

ԻՆ(2007) 2007 թվականին փաստացի իրականացված ներդրումների ծավալն

- է, որը կազմել է 321,95 մլն դրամ,
- ԱԱ(2007) 2007 թվականին փաստացի իրականացված անավարտ աշխատանքների ծավալն է, որը կազմել է 129,49 մլն դրամ,
- ԱԱՇ(2006) 2006 թվականին անավարտ մնացած այն աշխատանքների արժեքն է, որոնք շահագործման են հանձնվել 2007 թվականին: Այդ գումարը կազմել է 387,35 մլն դրամ:
- ՕՕՉՆ(2007) օգտակար և օգտագործվող չհամարվող ներդրումներ: Այս ծավալի մեջ ներառված են Երևան ՆԷԿ-ում հիդրոգեներատորի փաթույթների ապամոնոփաժման և գլխամասային հանգույցի վերակառուցման նախագծի փորձաքննության արժեքները, քանի որ այդ աշխատանքների արդյունքները դեռևս չեն օգտագործվում լիցենզավորված գործունեության ընթացքում: Նշված ներդրումները կներառվեն միայն այդ ուղղություններով նախատեսվող աշխատանքների ամբողջական ավարտից հետո: Այդ գումարը կազմում է 0,64 մլն դրամ:

Այսպիսով, 2007 թվականին փաստացի իրականացրած ներդրումների ծավալից սակագնով փոխհատուցման ենթակա ներդրումների ծավալը կկազմի՝

$$321,95 - 129,49 + 387,35 - 0,64 = \mathbf{579,17 \text{ մլն դրամ}}$$
